

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÓRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 5º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 7,37% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a locação de container e consumo de água e energia, chegando a um total acumulado de 87,51% dos serviços previstos.
- **Transporte:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.

- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, foram executados 49,83% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a instalação dos cabos elétricos, eletroduto, caixa de passagem, rele foto elétrico e luminária de LED, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 71,40%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, desta forma o percentual executado permanece em 8,89%.
- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, os serviços referente a este grupo de serviços foram iniciados e concluídos, referente a estrutura metálica para passarela, desta forma, 100,00% dos serviços previstos foram executados.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, os serviços referente a este grupo de serviços foram iniciados e concluídos, referente a grade de proteção, desta forma, 100,00% dos serviços previstos foram executados.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 56,36% dos serviços previstos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 11,10% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro, chegando a um total acumulado de 73,96%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo, no que tange a pintura de piso, desta forma, o total executado chega a 22,34%.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 19,48% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciando o término na instalação monumento, término da limpeza do canal, e execução das placas de concreto, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 87,97% dos serviços previstos.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2

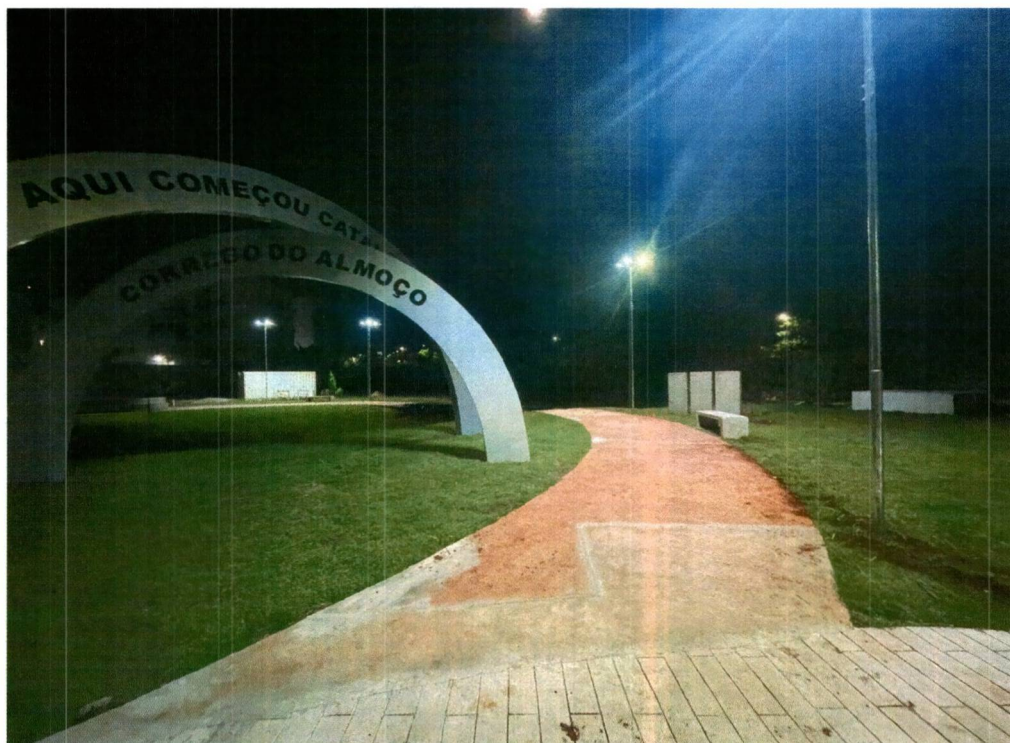


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Catalão, 26 de março de 2024.

 
Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil

ECA ENGENHARIA LTDA

Construção de Praça Pública no Córrego do Almoço - Contrato nº 109/2023

					R\$ 644.733,75		
MEDIÇÃO	DATA	PROTOCOLO	VALOR	NF	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
1ª	12/09/2023	2023033529	R\$ 75.164,03	65	R\$ 75.164,03	R\$ 569.569,72	11,66%
2ª	17/10/2023	2023037632	R\$ 77.979,12	66	R\$ 153.143,15	R\$ 491.590,60	23,75%
3ª	13/12/2023	2023045497	R\$ 102.241,95	68	R\$ 255.385,10	R\$ 389.348,65	39,61%
4ª	08/02/2024	2024005726	R\$ 152.273,34	69	R\$ 407.658,44	R\$ 237.075,31	63,23%
5ª	25/03/2024	2024011765	R\$ 128.862,50	70	R\$ 536.520,94	R\$ 108.212,81	83,22%

Controle de pagamentos da Secretaria de Obras.

CATALÃO, 26 DE MARÇO DE 2024.

João Marques

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão
