LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÓRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 6º (sexto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 6° boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 12,49% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a locação de container, consumo de água e energia, limpeza do terreno (faixa de domínio trilhos), chegando a um total acumulado de 100,00% dos serviços previstos.

- **Transporte:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.

- **Serviços em terra:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.

- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado nos boletins de medições anteriores, todos os serviços relacionados a este grupo de serviço, foram devidamente executados e concluídos. Desta forma, o total acumulado é de 100,00%.

- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, foram executados 25,26% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a instalação dos cabos elétricos, rele foto elétrico, luminária de LED, poste decorativo e lâmpada bulbo, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00%.

- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, foram executados 73,70% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a instalação de torneira, tubo 25mm, tê e união, desta forma o percentual executado chega a 100,00%.

- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, foram executados 50,00% dos serviços referente a este grupo, referente a estrutura metálica da passarela, desta forma, 100,00% dos serviços previstos foram executados.

- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, foram suprimidos 21,92% dos serviços não executados em totalidade, referente a grade de proteção, desta forma, 100,00% dos serviços foram executados.

- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 35,16% dos serviços relacionados a este grupo, sendo constatado o piso desempenado e ladrilho de uma cor para as rampas de acessibilidade desta forma, o total acumulado chega a 100,00% dos serviços previstos.

- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 26,03% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro, chegando a um total acumulado de 100,00%.

- **Pintura:** No período referente a esta medição, foram conclupidos os serviços relacionados a este grupo, no que tange a pintura de piso, desta forma, o total executado chega a 100,00%.

- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 13,36% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciando o planio de grama esmeralda, instalação de obelisco e fabricação da placa de inauguração, execução das placas de concreto com placa descritiva, término da instalação da passarela, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 100,00% dos serviços previstos.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1

Figura 2

Figura 3

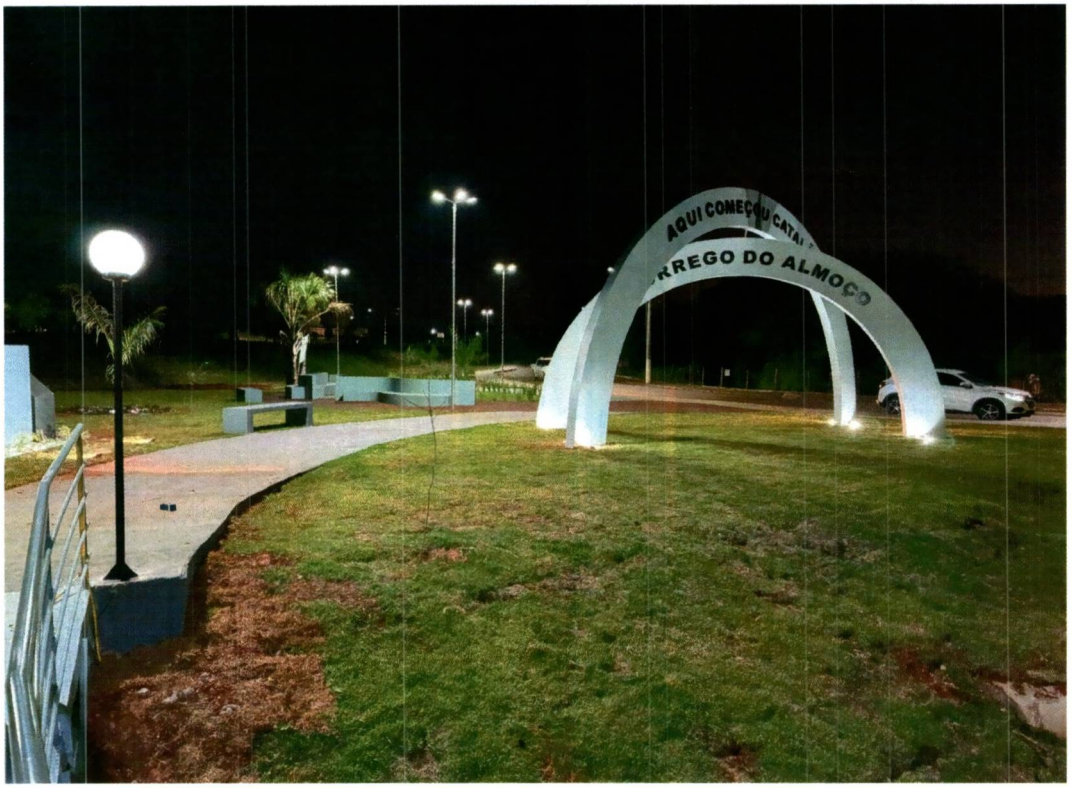

Figura 4

Figura 5

Figura 6

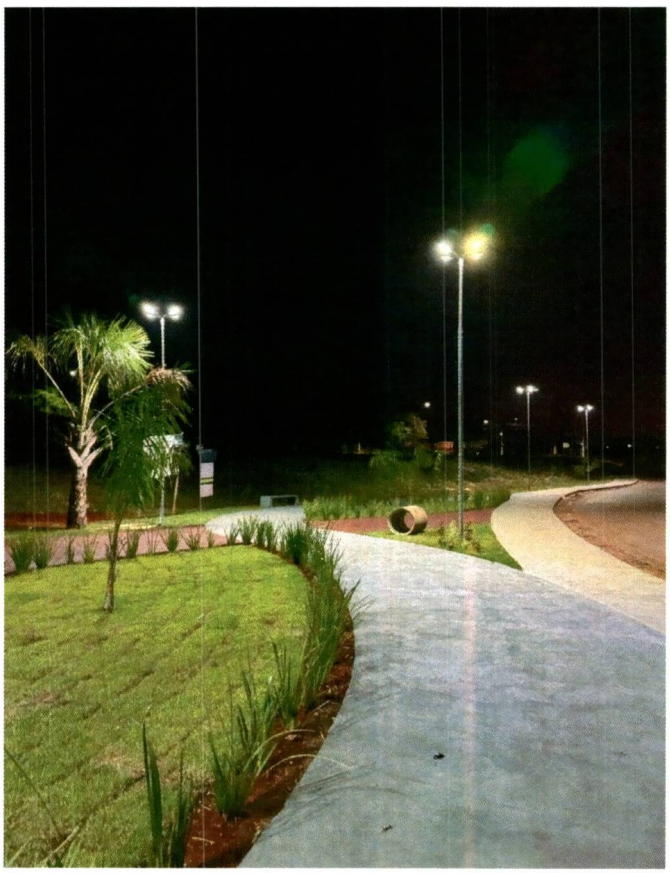

Figura 7

Catalão, 24 de abril de 2024.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
